



COMPARTILHAR E AVANÇAR



**EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
DE FRANCA**

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

REALIZAÇÕES EM 2018

FRANCA – SP
2018

EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Realizações em 2018

Relatório de apresentação das principais atividades executadas pela EMDEF no ano de 2018, incluindo obras e serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Franca e particulares.

SUMÁRIO

1	Resumo Geral de Atividades	03
2	Contratos de Serviços	
2.1	Contrato de Serviços para Prefeitura de Franca	
2.1.1	Manutenção de Vias Pavimentadas.....	05
2.1.2	Passeio em áreas Públicas.....	08
2.1.3	Sinalização de Trânsito	09
2.1.4	Execução de Lombo Faixa	11
2.1.5	Execução de Lombadas.....	12
3	Contrato de Obras	
3.1	Contrato de Obras para Prefeitura de Franca	
3.1.1	Passarela do Samba	14
3.1.2	Poliesportivo	15
3.1.3	Copacabana	29
3.2	Contrato de Obras para terceiros	
3.2.1	Atacadão S.A.....	29
3.2.2	Condomínio Franca Garden	20
3.2.3	Cocapec.....	20
3.2.4	Copacabana... ..	21
3.2.5	Edifício Copenhagen... ..	21
3.2.6	Democrata Claçados.....	24
3.2.7	Villagio Di Firenze... ..	24
3.2.8	Bairro Jd. Botânico.....	24
3.2.9	Magazine Luiza... ..	25

3.2.10	Pestalozzi... ..	25
3.2.11	Sabesp... ..	25
3.2.12	Sabesp... ..	26
3.2.13	Sabesp... ..	26
3.2.14	Santa Georgina... ..	27
3.2.15	Travessa Rua Francisco Tarsia... ..	27

4	Operação do Aterro Sanitário	28
5	Operação da Pedreira	30
6	Transporte Coletivo	32

1 – Resumo Geral de Atividades

Descrição do serviço	Total	Unidade
Área Pavimentada	629,82	m2
Escavação de Vala	1274,41	m3
Guias Executadas	465,71	m
Aterro Compactado	44,70	m3
Passeio de Concreto (m2)	11252,25	m2
Pintura de Solo (m2)	75822,00	m2
Remendo Asfáltico com CBUQ (m3)	3779,63	m3
Instalação de placas de trânsito (und)	2078,00	und
Lombadas	293,40	m

Tabela 1: Resumo geral das realizações de 2018

Tipo	Local	Descrição da Obra	Valor	Valor Medido no ano
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca	R\$ 5.007.800,00	R\$ 3.747.254,98
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Execução de lombadas	R\$ 127.700,00	R\$ 28.834,66
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Execução de lombo faixa	R\$ 320.872,64	R\$ 190.183,20
Serviço	Áreas públicas do Município de Franca	Execução de Passeio em Áreas Públicas	R\$ 767.850,00	R\$ 476.996,68
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Sinalização de Trânsito	R\$ 2.028.047,40	R\$ 75.952,65
Serviço	Passarela do Samba	Pintura	R\$ 6.045,00	R\$ 6.045,00
Obra	Poli esportivo	Quadra de Futebol Society	R\$ 121.576,94	R\$ 121.576,84
Serviço	Copacabana	Água e esgoto	R\$ 574.679,42	R\$ 28.611,03
Serviço	Atacadão S.A	Remendo Asfáltico	R\$ 757,98	R\$ 757,98
Serviço	Condomínio Franca Garden	Execução de Lombadas e Sinalização	R\$ 22.591,00	R\$ 20.411,00
Serviço	COCAPEC	Sinalização viária Horizontal	R\$ 20.991,09	R\$ 20.991,09
Serviço	Copacabana	Pavimentação Externa	R\$ 73.417,36	R\$ 139.439,80
Serviço	Edifício Copenhagen	Recuperação de pavimento	R\$ 23.814,89	R\$ 23.814,89
Serviço	Democrata Calçados e Artefatos de Couro	Remendo Asfáltico	R\$ 7.916,92	R\$ 7.916,92
Serviço	Villaggio Di Firenze	Execução de Lombada e Sinalização Vertical e Horizontal	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
Serviço	Bairro Jd. Botânico	Sinalização de Trânsito	R\$ 84.000,00	R\$ 78.041,43

Serviço	Magazine Luiza, antigo HB	Recapeamento Asfáltico e Sinalização	R\$	111.598,87	R\$	105.998,33
Serviço	FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI	Recapeamento Asfáltico	R\$	12.733,11	R\$	12.733,11
Serviço	Sabesp	Remendo Asfáltico com CBUQ	R\$	5.941,16	R\$	5.941,16
Serviço	Sabesp	Reparo em Guia e Sarjeta	R\$	545,36	R\$	545,36
Serviço	Sabesp	Remendo Asfáltico com CBUQ	R\$	3.018,24	R\$	3.018,24
Serviço	Santa Georgina	Sinalização de Trânsito e Lombadas	R\$	15.000,00	R\$	14.999,99
Serviço	Travessa Rua Francisco Társia	Recapeamento Asfáltico com CBUQ	R\$	7.440,00	R\$	7.440,00
Total			R\$	9.360.662,71	R\$	5.133.829,66

Tabela 2 Resumos das Obras e Serviços Executados

2 – Contratos de Serviços

2.1 – Serviços para Prefeitura de Franca

2.1.1 – Manutenção de Vias Pavimentadas – Remendo Asfáltico

Execução de remendo asfáltico com massa usinada a Quente (CBUQ) e PMF (Pré-misturado a Frio) nas Ruas e Avenidas do Município de Franca

Processo nº:	45425/17
Contrato nº:	0114/17
Início:	04/12/2017
Término:	03/12/2018
Valor total:	R\$ 5.007.800,00
Valor medido no ano:	R\$ 3.747.254,98

Pedidos Atendidos:

TAPEZAP: 410

Disque Tapa-Buracos: 76

Outros: 31

Indicação de Vereadores: 3

Total: 520

Produção de Remendo Asfáltico em m ³	
Janeiro	466,07
Fevereiro	354,77
Março	533,09
Abril	368,93
Maiο	316,23
Junho	243,29
Julho	287,55

Agosto	248,54
Setembro	209,46
Outubro	289,75
Novembro	308,51
Dezembro	0,00
Total	3626,19

Tabela 3: Produção de Remendo asfáltico em m³ em 2018

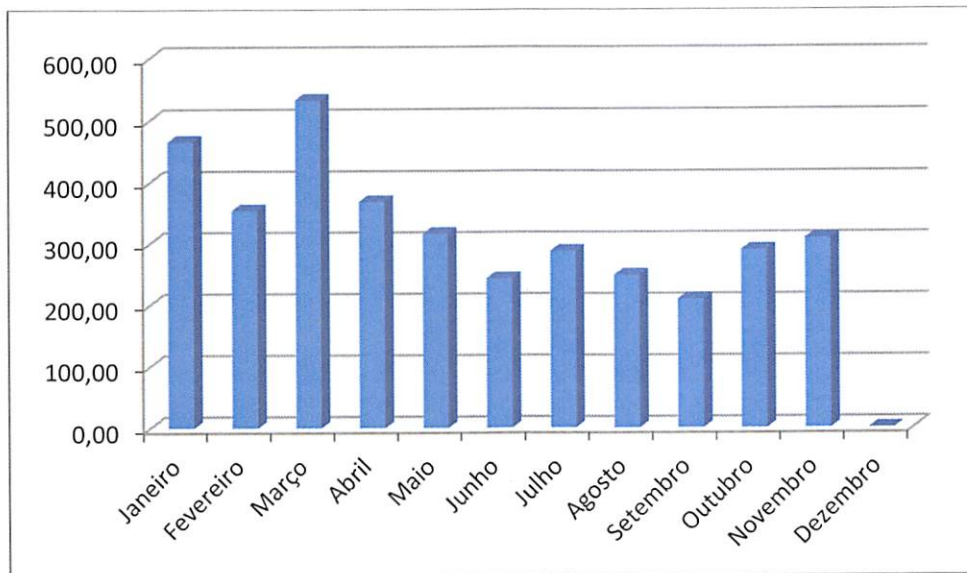


Gráfico 1: Gráfico de produção de Remendo Asfáltico



Figura 1: Remendo Asfáltico



Figura 2: Remendo Asfáltico

2.1.2- Execução Passeio em áreas Públicas

Execução e reforma de passeio em áreas públicas no município de Franca

Nº do Processo da Prefeitura de Franca: 455426/17

Contrato nº: 0111/17

Valor do Contrato: R\$ 767.850,00

Valor Medido no ano: R\$ 476.996,68

Início: 01/01/2018

Término 03/09/2018

Quantidade executada: 8.535,45m²



Figura 3: Passeio de Concreto

2.1.3–Sinalização de Trânsito

Nº do Proc. da Prefeitura: 043/2015

Valor do Contrato: R\$2.028.047,40

Valor Medido no ano: R\$ 75.952,65

Início: 03/01/2018

Término: 28/11/2018

Principais Quantitativos:

- Pintura de Solo: 69.318,13m²
- Instalação de Placas: 1.871,00 unidades



Figura 4: Pintura com tinta viária



Figura5: Pintura com tinta viária

2.1.4 – Execução de Lombofaixa

Execução de faixa elevada nas ruas e avenidas do município de Franca com CBUQ

Nº do Proc. da Prefeitura: 4092/17

Nº do Contrato 017/17

Valor do Contrato: R\$ 256.698,11

Valor Aditado R\$ 64.174,52

Valor Medido no ano: R\$ 190.183,20

Início: 23/04/2018

Término: 11/07/2018

Quantidade instalada: 203,30 m



Figura 6: Execução de Lombofaixa

2.1.5 – Execução de Lombadas

Execução de lombadas nas ruas e avenidas do município de Franca com CBUQ.

Nº do Proc. da Prefeitura: 14.477/17

Nº do Contrato: 0076/17

Valor do Contrato: R\$ 102.160,00

Valor Aditado: R\$ 25.540,00

Valor Medido no ano: R\$ 28.834,66

Início: 23/04/2018

Término: 04/05/2018

Quantidade instalada: 112,90m

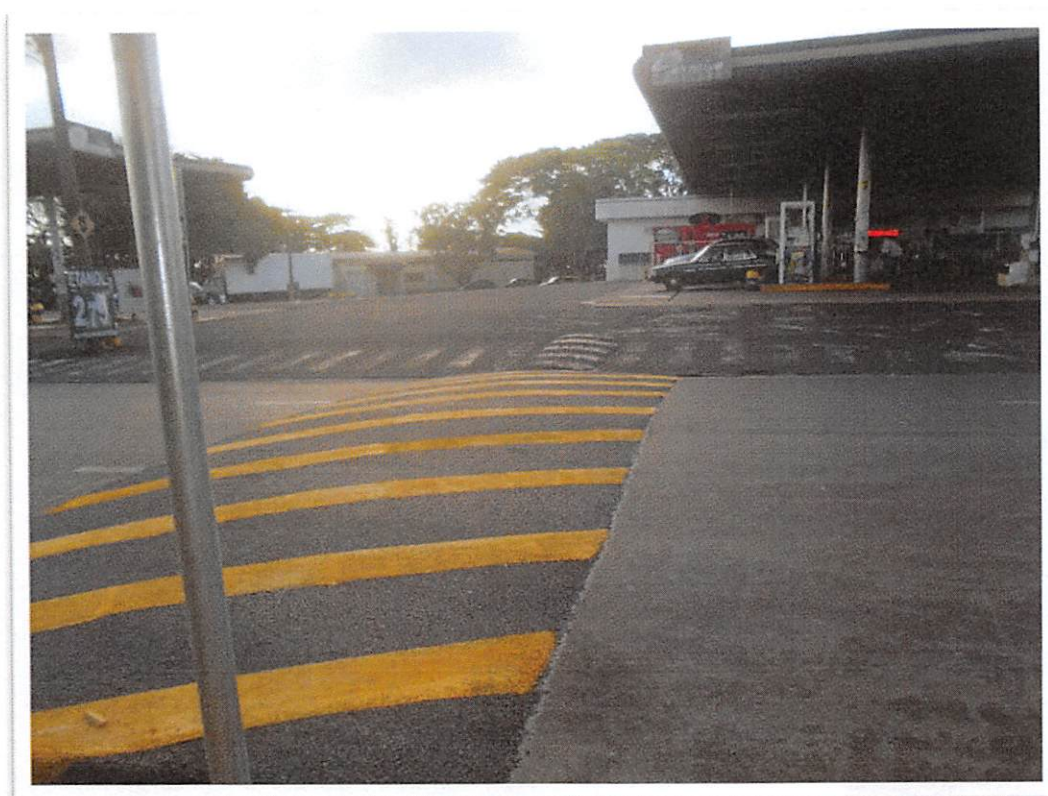


Figura 7: Execução de Lombada
