

EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

---

## Realizações em 2017

Relatório de apresentação das principais atividades executadas pela EMDEF no ano de 2017, incluindo obras e serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Franca e particulares.

# SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>Resumo Geral de Atividades .....</b>	<b>04</b>
<b>2</b>	<b>Contratos de Serviços</b>	
<b>2.1</b>	<b>Contrato de Serviços para Prefeitura de Franca</b>	
2.1.1	Manutenção de Vias Pavimentadas .....	06
2.1.2	Passeio em áreas Públicas .....	10
2.1.3	Sinalização de Trânsito .....	11
2.1.4	Execução de Lombofaixa .....	13
2.1.5	Execução de Lombadas .....	14
<b>3</b>	<b>Contrato de Obras</b>	
<b>3.1</b>	<b>Contrato de Obras para terceiros</b>	
3.1.1	Usina Buriti .....	15
3.1.2	Res. Porto dos Sonhos .....	16
3.1.3	Recanto Campeste Ouro Verde .....	17
3.1.4	Savegnago .....	18
3.1.5	Postos de Combustível .....	19
3.1.6	Copacabana- Pavimentação .....	20
3.1.7	Rua Capitão Zeca de Paula... ..	22
3.1.8	Pacaembu... ..	23
<b>3.2</b>	<b>Contrato de Obras para Prefeitura de Franca</b>	
3.2.1	Copacabana – água e esgoto .....	24
3.2.2	Corpo de Bombeiros .....	26
3.2.3	Interligação de ruas do Parque Vicente Leporace....	28
3.2.4	8ª Célula do Aterro Sanitário – .....	30

3.1.8	8ª Célula do Aterro Sanitário - EMDEF... ..	31
<b>4</b>	<b>Operação do Aterro Sanitário.....</b>	<b>32</b>
<b>5</b>	<b>Operação da Pedreira.....</b>	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Transporte Coletivo.....</b>	<b>36</b>

## 1 – Resumo Geral de Atividades

Descrição do serviço	Total	Unidade
Área Pavimentada	10918,25	m2
Boca de Lobo	15,00	und
Escavação de Vala	1999,63	m3
Lombofaixa	234,60	m
Guias Executadas	1607,49	m
Movimentação de Terra	63186,00	m3
Passeio de Concreto (m2)	4677,90	m2
Pintura de Solo (m2)	81322,09	m2
Plantio de Grama (m2)	4383,56	m2
Rede de Galeria (m)	626,30	m
Remendo Asfáltico com CBUQ (m3)	5651,42	m3
Instalação de placas de trânsito (und)	2407,00	und
Lombadas	568,60	m
Instalação de Geomembrana PEAD	22500,00	m2

**Tabela 1: Resumo geral das realizações de 2017**

<b>Tipo</b>	<b>Local</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Valor Medido no ano</b>
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca	R\$ 5.718.600,00	R\$ 3.415.486,80
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca	R\$ 4.006.240,00	R\$ 1.260.545,02
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Execução de lombofaixa	R\$ 256.698,11	R\$ 213.619,40
Serviço	Áreas públicas do Município de Franca	Execução de Passeio em Áreas Públicas	R\$ 528.937,50	R\$ 130.205,80
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Sinalização de Trânsito	R\$ 2.028.047,40	R\$ 835.377,93
Serviço	Usina Buriti	Remendo asfáltico	R\$ 176.500,04	R\$ 138.815,37
Serviço	Res. Porto dos Sonhos	Execução de lombadas	R\$ 7.551,52	R\$ 7.551,52
Serviço	Ouro Verde	Sinalização	R\$ 6.683,32	R\$ 6.683,32
Serviço	Savegnago	Sinalização	R\$ 4.256,61	R\$ 4.256,61
Serviço	Postos de Combustível	Sinalização	R\$ 82.796,01	R\$ 82.796,01
Serviço	Ruas e Avenidas de Franca	Execução de Lombadas	R\$ 127.700,00	R\$ 125.950,51
Obra	Copacabana	Pavimentação	R\$ 420.228,63	R\$ 377.359,43
Obra	Copacabana	Água e esgoto	R\$ 574.679,42	R\$ 454.165,02
	Vida nova Franca - Pacaembu	Limpeza	R\$ 830.813,93	R\$ 347.292,27
Obra	Aterro Sanitário - Prefeitura de Franca	Abertura da 8ª Célula	R\$ 1.681.352,60	R\$ 1.440.885,10
Obra	Aterro Sanitário - EMDEF	Abertura da 8ª Célula	R\$ 621.870,14	R\$ 621.870,14
Obra	Rua Capitão Zeca de Paula	Drenagem	R\$ 97.938,75	R\$ 97.938,75
Obra	Corpo de Bombeiros	Execução do pátio	R\$ 110.029,65	R\$ 110.029,65
Obra	Pq. Vicente Leporace	Interligação das vias do bairro	R\$ 330.296,02	R\$ 206.340,52

**Tabela 2 Resumos das Obras e Serviços Executados**

## **2 – Contratos de Serviços**

### **2.1 – Serviços para Prefeitura de Franca**

#### **2.1.1 – Manutenção de Vias Pavimentadas – Remendo Asfáltico**

Execução de remendo asfáltico com massa usinada a Quente (CBUQ) e PMF (Pré-misturado a Frio) nas Ruas e Avenidas do Município de Franca

Processo nº: 21.593/2016  
Contrato nº: 106/2016  
Início: 28/06/2016  
Término: 06/09/2017  
Valor total: R\$ 5.719.600,00  
Valor medido no ano: R\$ 3.415.486,80

Processo nº: 45.425/2017  
Contrato nº: 0114/17  
Início: 04/12/2017  
Término: 26/12/2017  
Valor total: R\$ 4.006.240,00  
Valor medido no ano: R\$ 1.260.545,02

#### **Pedidos Atendidos:**

TAPEZAP: 2147


Disque Tapa-Buracos: 692

Outros: 287

Total: 3.126

Produção de Remendo Asfáltico em m <sup>3</sup>	
Janeiro	479,00
Fevereiro	506,00
Março	326,00
Abril	484,00
Maio	508,50
Junho	618,00
Julho	497,80
Agosto	667,86
Setembro	231,34
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	1141,57
<b>Total</b>	<b>5460,07</b>

**Tabela 3: Produção de Remendo asfáltico em m<sup>3</sup> em 2017**

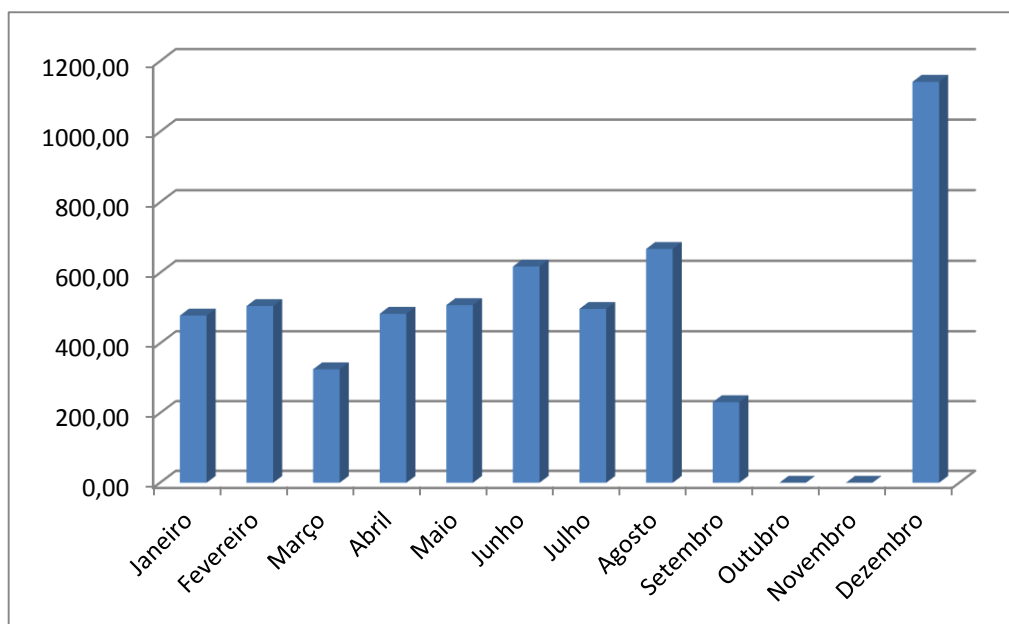

**Figura 1: Gráfico de produção de Remendo Asfáltico**



**Figura 2: Remendo Asfáltico**



**Figura 3: Remendo Asfáltico**



**Figura 4: Remendo Asfáltico**

### **2.1.2- Execução Passeio em áreas Públicas**

Execução e reforma de passeio em áreas públicas no município de Franca

Nº do Processo da Prefeitura de Franca: 50.008/15

Valor do Contrato: R\$ 528.937,50

Valor Medido no ano: R\$ 130.205,80

Início: 01/03/2017

Quantidade executada: 3.233,32m<sup>2</sup>



**Figura 5: Passeio de Concreto**

## 2.1.5–Sinalização de Trânsito

Nº do Proc. da Prefeitura: 12440/2015

Valor do Contrato: R\$2.028.047,40

Valor Medido no ano: R\$ 835.377,93

Início: 02/04/2017

Principais Quantitativos:

- Pintura de Solo: 73439,85 m<sup>2</sup>
- Instalação de Placas: 2380,00 unidades



Figura 6: Pintura com tinta viária



**Figura 7: Pintura com tinta viária**

### **2.1.6 – Execução de Lombofaixa**

Execução de faixa elevada nas ruas e avenidas do município de Franca com CBUQ

Nº do Proc. da Prefeitura: 017/17

Valor do Contrato: R\$ 256.698,11

Valor Medido no ano: R\$ 213.619,40

Início: 24/08/2017

Quantidade instalada: 31 unidades



**Figura 8: Execução de Lombofaixa**

### **2.1.7 – Execução de Lombadas**

Execução de lombadas nas ruas e avenidas do município de Franca com CBUQ.

Nº do Proc. da Prefeitura: 14.477/17

Valor do Contrato: R\$ 127.700,00

Valor Medido no ano: R\$ 125.950,00

Quantidade instalada: 493,15 m

### **3 – Contratos de Obras**

#### **3.1 – Obras para terceiros.**

##### **3.1.1 –Usina Buriti**

Remendo asfáltico nas ruas da Usina Buriti

Valor do Contrato: R\$ 176.500,04

Valor Medido: R\$ 138.815,07

Início: 05/08/2017

Principais Quantitativos:

- Remendo asfáltico com CBUQ: 184,01m<sup>3</sup>

### **3.1.2 – Residencial Porto dos Sonhos**

Execução de Lombadas

Nº do Contrato 071.17

Valor do Contrato: R\$ 7.551,52

Valor Medido: R\$ 7.551,52

Início: 02/10/2017

Principais Quantitativos:

- Lombadas executadas: 75,45 m

### **3.1.3 – Recanto Campeste Ouro Verde**

Sinalização das vias do Recanto Campeste Ouro Verde

Nº do Contrato: 101.1.17

Valor do Contrato: R\$ 6.683,32

Valor Medido: R\$ 6.683,32

Início: 18/12/2017

Principais Quantitativos:

- Pintura de solo: 56,27m<sup>2</sup>
- Instalação de placas: 27,00 unidades

### **3.1.4 – Savegnago**

Sinalização de vagas do estacionamento.

Nº do contrato: 101-17

Valor do Contrato: R\$ 4.256,61

Valor Medido: R\$ 4.256,61

Início: 23/10/2017

Principais Quantitativos:

- Pintura de solo: 83,78 m<sup>2</sup>
- Recapeamento asfáltico com CBQU: 2,35 m<sup>3</sup>

### **3.1.5 – Postos de Combustível**

Sinalização horizontal.

Valor do Contrato: R\$ 82.796,01

Valor Medido: R\$ 82.532,01

Início: 26/04/2017

Principais Quantitativos:

- Pintura de solo: 2.375,13m<sup>2</sup>

### **3.1.6 – Copacabana**

Pavimentação externa do Residencial Copacabana.

Numero do contrato: 085-2017

Valor do Contrato: R\$ 420.228,63

Valor Medido: R\$ 337.359,43

Início: 04/09/2017

Principais Quantitativos:

- Área pavimentada: 7981,25 m<sup>2</sup>
- Guias executadas: 846,1m



**Figura 9 Pavimentação**



**Figura 10 Pavimentação**

### **3.1.7 – Rua Capitão Zeca de Paula**

Execução da rede de drenagem da Rua Capitão Zeca de Paula.

Valor do Contrato: R\$ 97.938,75

Valor Medido: R\$ 97.938,75

Início: 04/12/2017

Principais Serviços:

- Boca de Lobo: 3,00 unidades
- Rede de galeria: 204,50 m
- Escavação de vala: 680,99m<sup>3</sup>

### **3.1.8 – Pacaembu**

Serviço de destocamento, limpeza de solo vegetal e bota fora.

Valor do Contrato: R\$ 830.813,93

Valor Medido: R\$ 347.292,27

Início: 11/12/2017

## **3.2 – Obras para a Prefeitura de Franca**

### **3.2.1– Copacabana**

Copacabana - Rede Adutora de Água e Rede de Esgoto

Nº Proc. da Prefeitura de Franca: 59.892/16

Valor do Contrato: R\$ 574.679,42

Valor Medido: R\$ 454.165,02

Início: 01/06/2017

Principais Quantitativos:

- Área Pavimentada: 663,65 m<sup>2</sup>
- Rede de água: 869,00 m
- Rede de esgoto: 701,00 m
- Escavação de vala: 1.264,09m<sup>3</sup>



**Figura 11** Execução da rede de água e esgoto



**Figura 12 Execução rede de água e esgoto**

### **3..2.3 – Pátio Corpo de Bombeiro –Dinfra**

Pavimentação do Pátio do Corpo de Bombeiros no Distrito Industrial de Franca.

Nº Proc. da Prefeitura de Franca: 53774/2016

Valor do Contrato: R\$ 110.029,65

Valor Medido: R\$ 110.029,65

Principais Serviços:

- Área pavimentada: 2.271 m<sup>2</sup>
- Guias executadas: 101,00 m
- Pintura de solo: 2.271m<sup>2</sup>



**Figura 13 Pavimentação**
